
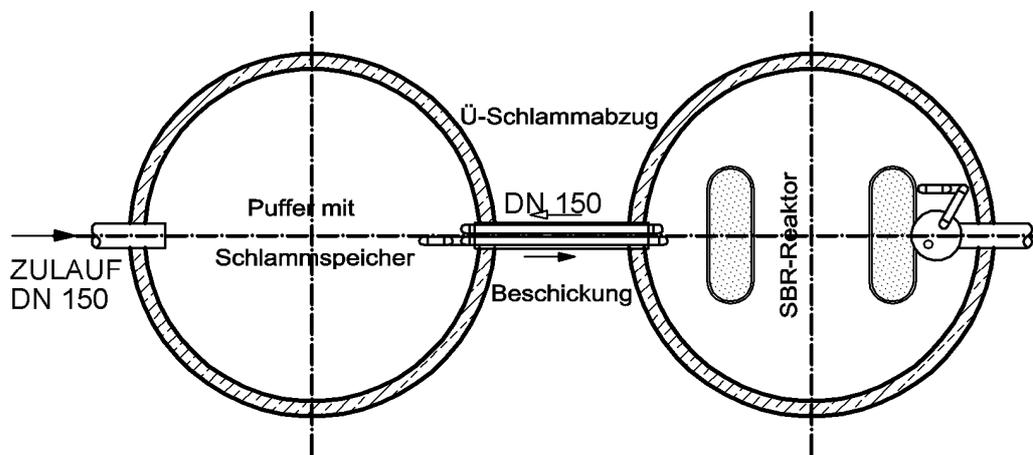


Systemzeichnung Lauterbach-Kießling SBR - Aufstausystem  für 20 EW nach DIN 4261 Teil 2
in Monolith 2 Behälterausführung Typ LKSBR M 20 Z.55.31- 483 (Kl. C)
Typ LKSBR M 20 Z.55.31- 628 (Kl. N)
Typ LKSBR M 20 Z.55.31- 629 (Kl. D)

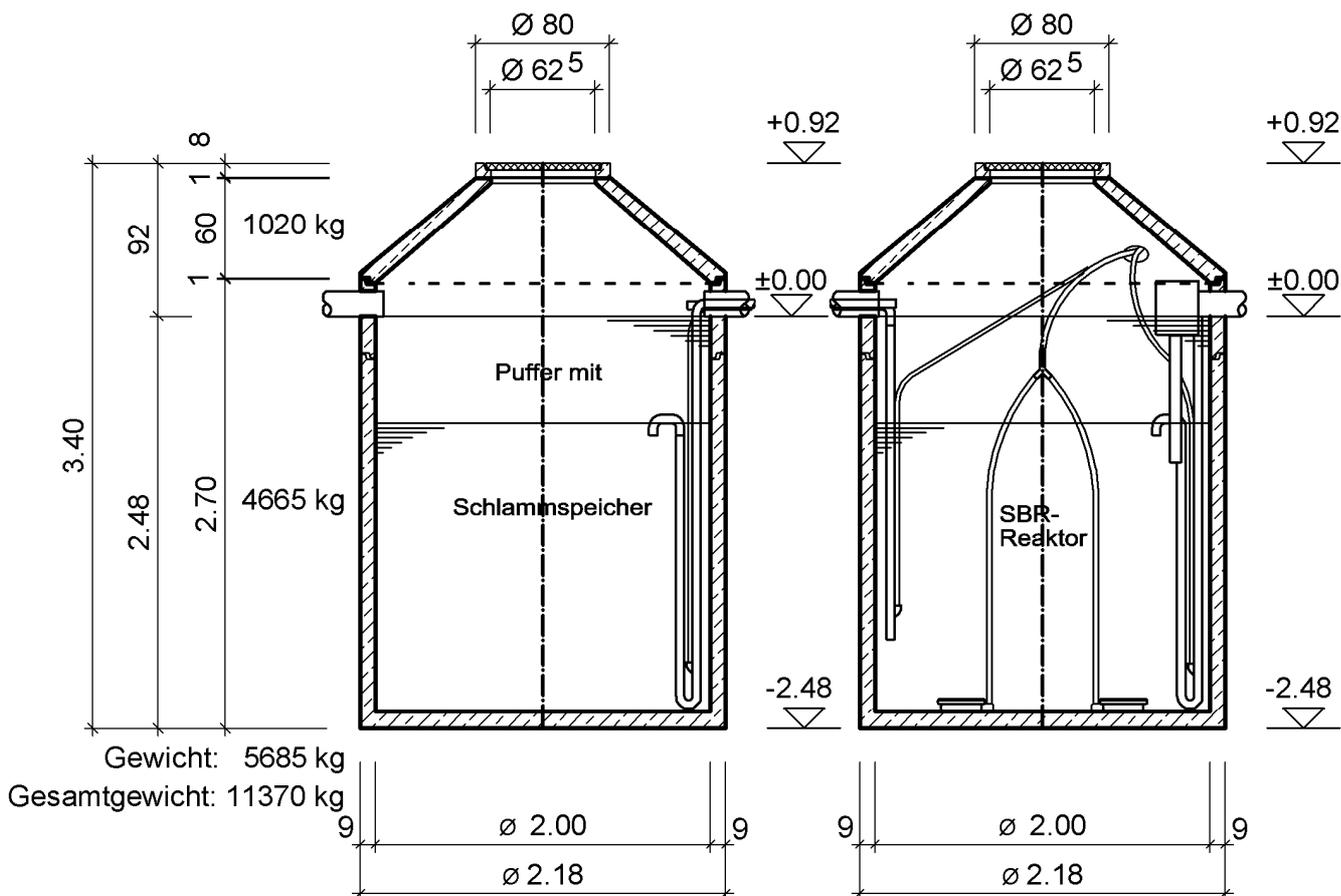

Ausschreibungstext LKSBR M 20, Art. Nr. 702201200

Kleinkläranlage nach DIN 4261/2 liefern

Kleinkläranlage nach DIN 4261 Teil 2 und Euronorm prEN 12566 mit Konus, werksseitig eingebaute Ein-/Auslauf Öffnung mit Bodenstück und begehbare Abdeckung frei Baustelle liefern und einbauen.

Baukörper: Dichtwanne als Betonfertigteile fugenlos aus einem Stück

(alternativ Betonfertigteile nach DIN 4034 Teil 2)

Krangstellung: nach Erfordernis ohne gesonderte Vergütung

Fugendichtstoff: lt. Herstellerangabe ohne gesonderte Vergütung

Betongüte : C35/45

Expositionsklassen: XC4, XD3, XF2, XF2, XF3, XA2, XM2

Wandstärke : 90 mm

Veränderliche bautechnische Maße (lt. beiliegender Tabelle):

Durchmesser D1: 2000 mm / 2000 mm

Einbautiefe ET 1: 3450 mm / 3450 mm

Schwerstes Einzelteil: 4665 kg

Lauterbach-Kießling SBR-Anlage batchpur

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach Wasserrechtsbescheid

Z-55.31-483 Klasse C, Z-55.31-628 Klasse N und Z-55.31-629 Klasse D

bestehend aus:

belüftete Abdeckung für Kleinkläranlage

Betonbehälter monolithische Bauweise mit Trennwand

Konus mit Muffe DN 150 für Versorgungsleitungen

batchpur SBR-Rüstsatz vormontiert

Steckerfertiger GFK-Schaltschrank (mit Drucksensorsteuerung)

Füllstandsabhängige Zyklus- und Belüftungssteuerung

Optimale Ablaufwerte bei minimalem Energieeinsatz

Komplett mit 10m Schlauchpaket

Befestigungsmaterial

Betriebsbuch

Veränderliche abwassertechnische Maße (lt. beiliegender Tabelle):

EW: 20 EW

Gebälseleistung: 0,550 kW/h

Typ: LKSBR M 20

Technische Montage der Einzelkomponenten

Betriebsfertige Montage aller Einzelkomponenten in den Betonkorpus durch einen autorisierten Monteur der Herstellerfirma.

Werksseitig vormontiert oder Ausführung auf Baustelle je nach Erfordernis

Incl. An- und Abfahrt

Incl. Erforderlicher Maschinen und Kleingeräte

Incl. Befestigungsmaterial

Schaltschrank an geeigneter Stelle anbringen

Verbindungsschläuche für Mamutpumpen und Belüfter

in bauseits verlegtes Leerrohr einziehen, mit Schaltschrank verbinden

Dichtheitsprüfung nach DIN 4261/1 der Kleinkläranlage vor dem Verfüllen der Baugrube

Wasserstand des Behälters bis ca. 30 cm unter Einlaufhöhe nach der Dichtheitsprüfung absenken

Stromversorgung herstellen

Montageprotokoll

Inbetriebnahme

Probelauf

Herstellernachweis:

Lauterbach-Kießling GmbH

Industriestraße 2-4

95517 Seybothenreuth

Tel.: 09275 / 981-0 – Fax: 09275 / 981-11

www.lauterbach-kiessling.de

Einheitspreis: _____ EUR psch./Anlage

Einheitspreis: _____ EUR psch./Anlage
